

# **SIG-CDM**

**Appui à la mise en place de la  
Carte des projets de  
développement au MAROC**

**Comité de pilotage  
juillet 2009**

# **SOMMAIRE**

- **Contexte d'intervention**
- **Objectifs du Projet**
- **Montage partenarial et Budget**
- **Description du produit attendu**
- **Organisation du projet**
- **Etat d'avancement et perspectives**

# CONTEXTE D'INTERVENTION

## Déclaration de Paris 2005 – Efficacité de l'Aide au développement

### Appropriation

- Alignement
- Harmonisation
- Gestion axée sur les résultats
- Responsabilité mutuelle

⇒ Le Maroc a souscrit à la Déclaration de Paris et au plan d'action de Accra

# OBJECTIF DU SIG-CDM:

## PRODUIT ATTENDU :

Mise en place par le Ministère de l'Économie et des Finances - d'un Système d'Information Géographique des projets de Développement au Maroc domicilié à la Direction de Budget au profit du Ministère et de ses partenaires, à savoir : l'Administration Marocaine, les Bailleurs de Fonds et les Citoyens


## OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- " Outil d'analyse et d'aide à la décision
- " Outil de communication et de publication de l'information
- " Outil de travail en équipe et de coordination
- " Outil de planification, d'analyse et de suivi de l'engagement des partenaires dans le pays

# Apports et contribution

- Valeur-ajoutée:
  - capitaliser sur l'existant avec une interface géographique
  - Analyse et lien potentiel avec d'autres indicateurs de développement
  
- Novateur:
  - Projets financés/Projets nationaux structurants
  
- Durabilité:
  - Engagement et Contribution en nature de la Direction du Budget: pérennité assurée

# PARTENAIRES DU PROJET

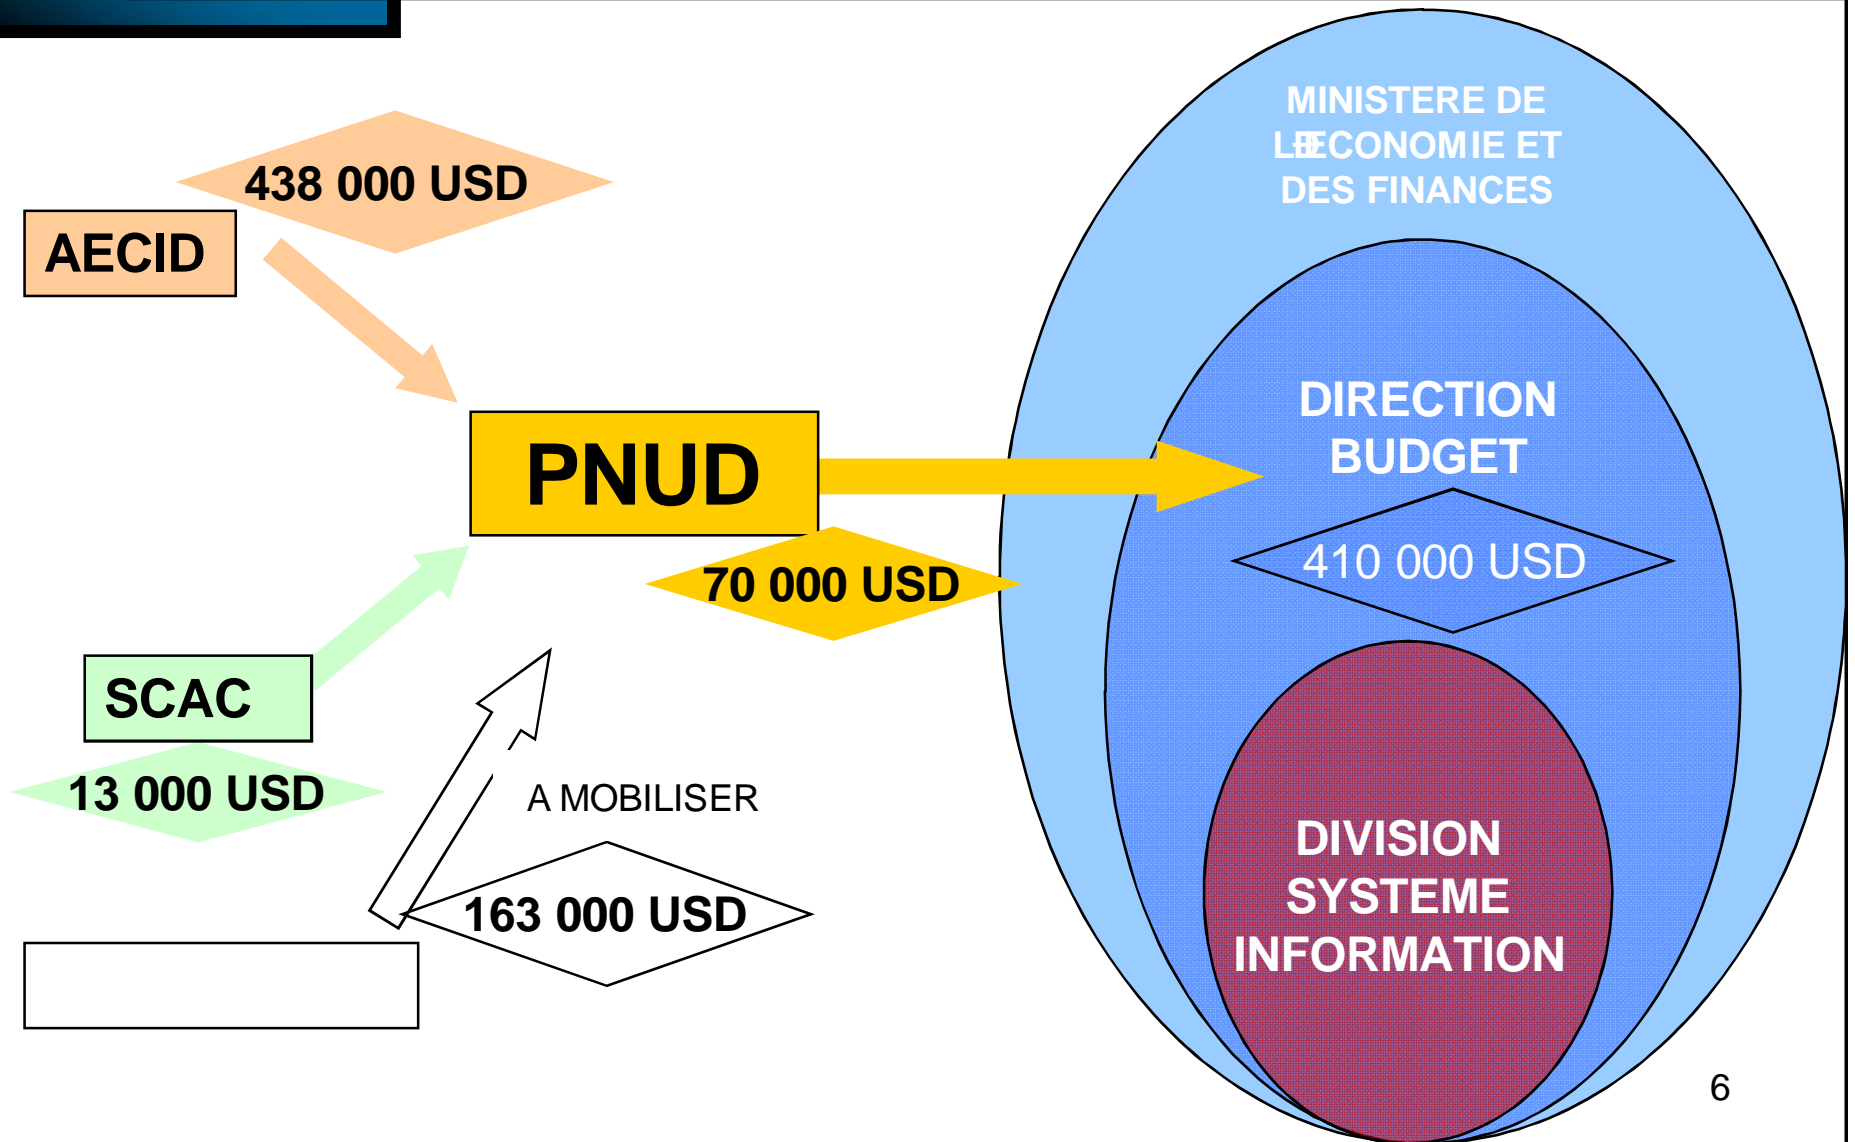

# PARTENARIAT ET BUDGET

Partenaires	Montant mobilisé USD
AECID	437 318USD
PNUD	70 000 USD
Coordonnateur Résident SNU	15 000 USD
SCAC	12 937USD
<b>TOTAL MOBILISE</b>	<b>535 255 USD</b>
<i>Direction du Budget (en nature)</i>	<i>410 000 USD</i>
<i>Ressources à mobiliser</i>	<i>163 483 USD</i>
<b>TOTAL</b>	<b>1 090 255 USD</b>

# POPULATION CIBLE


## Niveaux d'accès:

- Internet:
  - Cible : Citoyens
  - Consultation : Générale
  
- Extranet:
  - Cible : DB-DEPP-DTFE, Bailleurs de fonds, départements ministériels, et organismes publics.
  - Consultation : Spécifique
  
- Intranet:
  - Cible : MEF
  - Consultation : Approfondie.




# DESCRIPTION DU PROCESSUS

## Alimentation et contrôle - rappel-

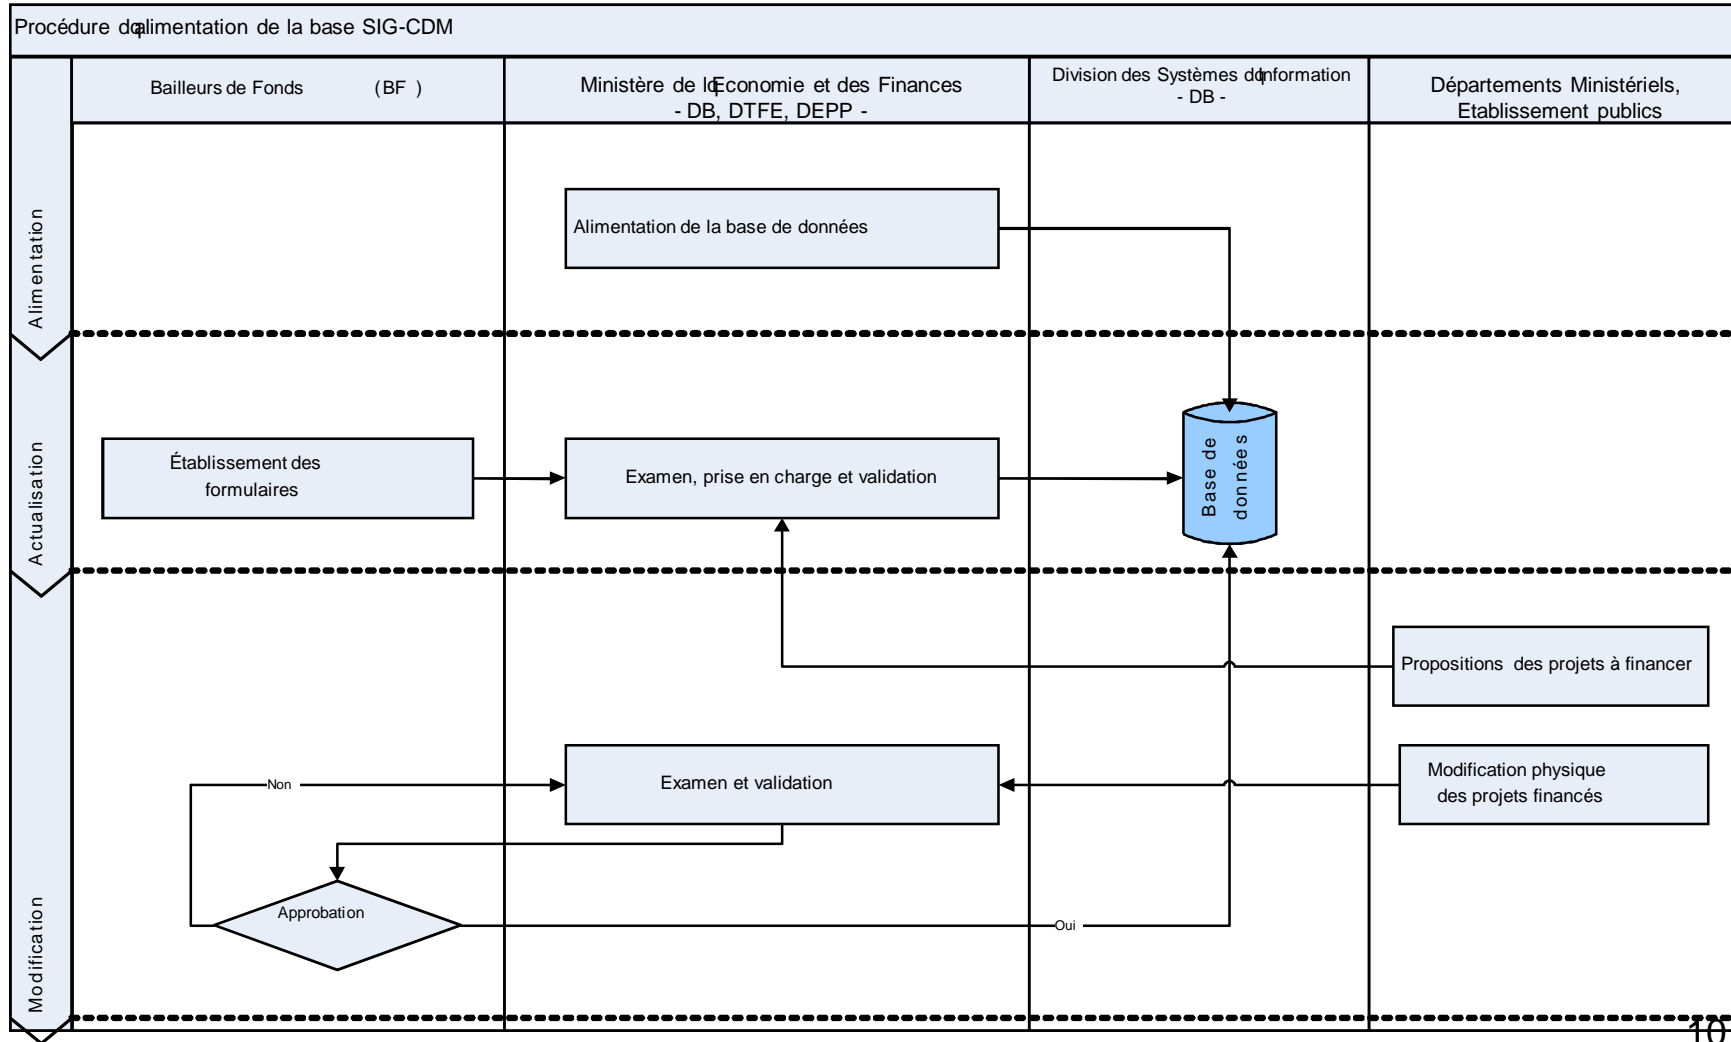

# Structure Organisationnelle

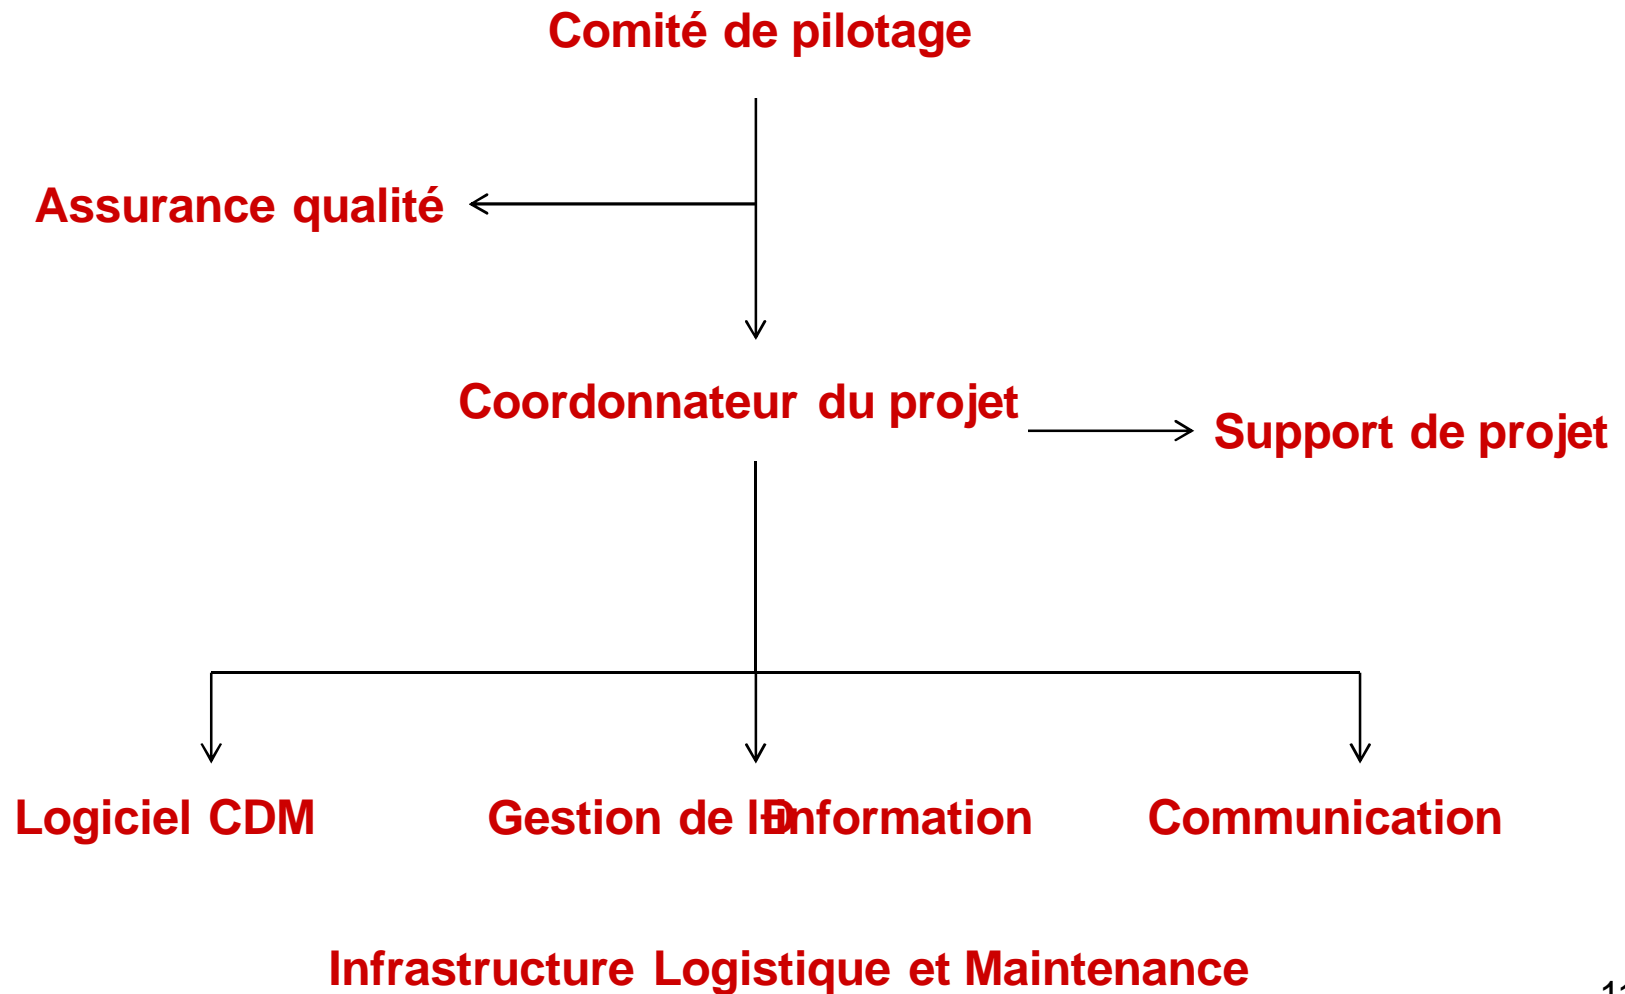


# Planification du projet

Signature de l'accord du projet (juin 2008)

Septembre 2009

Juin 2010

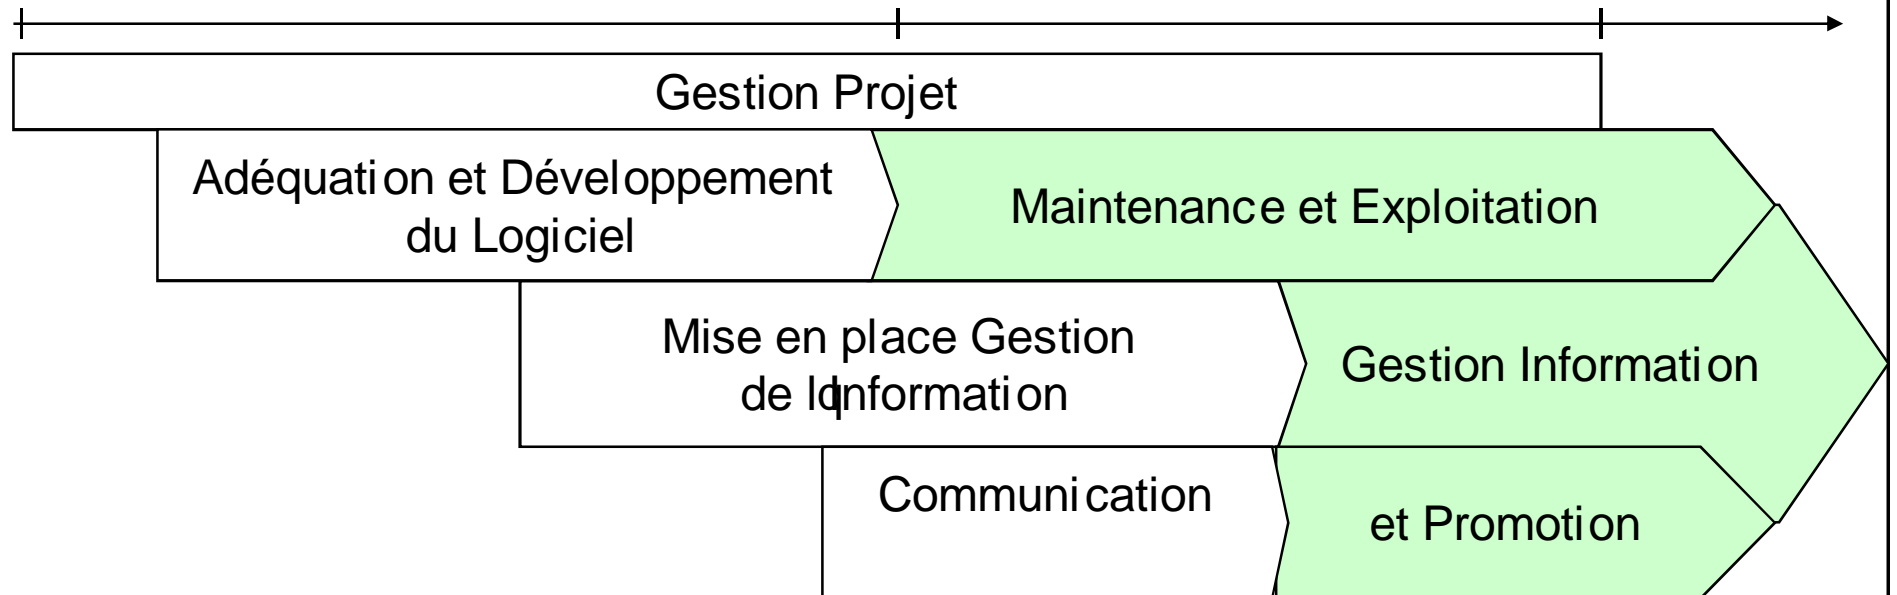

# Répartition du budget global par activité

<b>Adéquation et développement du logiciel</b>	<b>384 858 USD</b>
<b>Mise en place de la gestion de l'information</b>	<b>41 009 USD</b>
<b>Mise en place de l'infrastructure</b>	<b>107 255 USD</b>
<b>Communication</b>	<b>64 670 USD</b>
<b>Gestion du projet</b>	<b>100 946 USD</b>
<b>TOTAL</b>	<b>698 738 USD</b>

# Etat d'avancement

**Gestion du projet** : assurer les actions d'accompagnement, de suivi et évaluation et de formation, notamment en gestion de projet axée sur les résultats ainsi que le Reporting

Tâche	avancement
Désignation du coordonnateur et de l'équipe de gestion du projet	Réalisée
Formation de l'équipe de gestion du projet en gestion de projet axée sur les résultats	Réalisée (4 participants DB)
Planification du projet production des plans de travail annuels	Action continue
Suivi et Evaluation du projet <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reporting trimestriel assuré et réunion de suivi régulières</li><li>▪ Etudes de satisfaction – client produites</li><li>▪ Rapport des enseignements tirés du projet (Expérience Pilote du Maroc)</li></ul>	Action continue  Prévu prévu

**BUDGET GLOBAL : 100 946 USD**

**ENGAGEMENT : 0 USD**

**PAIEMENT : 0 USD**

# Etat d'avancement

**Adéquation et développement du Logiciel:** développer un logiciel pour la prise en charge, le partage et la consultation des données

Tâches	Avancement
Spécification des demandes: Cahier des Charges	Réalisée
Architecture et conception <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Modélisation de la solution technique</li><li>▪ Document Architecture</li></ul>	Réalisée
Développement du Code Source	Prévue fin Septembre 2009
Validation et Tests	Prévue Octobre 2009
Mise en fonctionnement <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Manuel Utilisateur</li><li>▪ Document de Formation</li><li>▪ Manuel de l'exploitation</li></ul>	Prévue Octobre 2009
Maintenance/Exploitation	A partir de Novembre 2009

**BUDGET GLOBAL : 384 858 USD**

**ENGAGEMENT : 175 883 USD (46%)**

**PAIEMENT : 153 335 USD (40%)**

**Direction du Budget (en nature):**

**Charge Prévue :1100 J/H**

**Charge réalisée (conception et en développement du système) : 560 J/H ( 50%)**

# Etat d'avancement

**Mise en place de la gestion de l'Information** : mettre en place les bases solides à une gestion durable de l'information. Le but de cette activité est de aboutir à la maîtrise de la Collecte, le Traitement et la Transformation/ Transmission et communication

Tâches	Avancement
Identification des Sources d'information	Réalisée
Composition de l'équipe	Partiellement Réalisée
Formation de l'équipe	Prévue Octobre 2009
Élaboration de procédures et de standards	Encours

**BUDGET GLOBAL : 41 009 USD**

**ENGAGEMENT : 0 USD**

**PAIEMENT : 0 USD**

# Etat d'avancement

**Communication et Promotion** : assurer au système sa visibilité à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication relative à la carte du développement

Tâches	Avancement
Désignation du chargé de communication	Réalisée
la stratégie de communication: Plan de capitalisation et de diffusion	Réalisée
la stratégie de communication: Plaidoyer pour une stratégie de communication	En cours de validation
Mise en œuvre de la stratégie de communication	Prévue Octobre 2009

**BUDGET GLOBAL : 64 670 USD**

**ENGAGEMENT : 12 044 USD**

**PAIEMENT : 3 122 USD**

# Etat d'avancement

**Mise en place de l'Infrastructure SIG:** l'acquisition et la mise en place de l'infrastructure de production, matérielle et logicielle pour le projet SIG ainsi que l'administration et suivi de l'exploitation de la solution mise en place.

Tâches	Avancement
Identification des besoins	Réalisée
Élaboration des termes de référence	Réalisée
Acquisition	Réalisée
Réception et installation	Prévue Septembre 2009
Mise en exploitation	Prévue Octobre 2009
Suivi et maintenance	Action continue

**BUDGET GLOBAL : 107 255 USD**

**ENGAGEMENT : 78 925 USD**

**PAIEMENT : 0 USD**

## Situation des engagements et des paiements (Montant en USD)

Composantes	Budget Global	Engagement	Paiement
Adéquation et développement du logiciel	384 858	175 883 (46%)	153 335 (40%)
Mise en place de la gestion de l'information	41 009	-	-
Mise en place de l'infrastructure SIG	107 255	78 925 (74%)	-
Communication et promotion	64 670	12 044 (19%)	3 122 (5%)
Gestion du projet	100 946	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>698 738</b>	<b>266 852 (38%)</b>	<b>156 457 (22%)</b>

### Direction du Budget (en nature):

**Total Charge Prévue : 1100 J/H**

**Total Charge réalisée (conception et en développement du système) : 560 J/H ( 50%)**
